



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №21 «Сказка» Старооскольского городского округа

Создание алгоритма подготовки детей к творческим конкурсам в МБДОУ ДС № 21 «Сказка»



Открытие проекта и анализ текущего состояния

1. Определение проблемы и темы проекта.
2. Указание начала и окончания процесса.
3. Анализ заинтересованных сторон. Формирование организационного комитета и творческой команды проекта.
4. Подготовка презентации проекта.



Процесс «Создание алгоритма подготовки детей к творческим конкурсам в МБДОУ ДС №21 «Сказка»

Общие данные:

Заказчик: Веретенникова Ж.А, заведующий

Процесс: подготовка детей к творческим конкурсам.

Границы процесса: с момента выбора конкурса и номинации до показа художественной программы во время выступления на конкурсе.

Руководитель проекта: Мясищева Ирина Витальевна, музыкальный руководитель.

Творческая команда проекта: воспитатели, узкие специалисты, кастелянша, родители воспитанников.

Обоснование выбора:

1. Долгий период подготовки к конкурсам.
2. Трудоемкий процесс (30% рабочего времени) подготовки к конкурсам.
3. Отсутствие алгоритма процесса подготовки к конкурсам.

Цель проекта:

Цель: Создание алгоритма подготовки детей к творческим конкурсам.

Сокращение времени подготовки к конкурсу с 38 рабочих дней до 31 рабочего дня.

Результат: Разработанный алгоритм подготовки к творческим конкурсам.

Сокращение времени подготовки к конкурсу до 31 рабочего дня.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Защита карточки проекта 20.09.2019
2. Картирование 23.09.2019
3. Анализ текущей ситуации 24.09.2019
4. Определение конкретных проблем 24.09.2019
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») с 24.09.2019 по 01.10.2019
6. Защита проекта 02.10.2019
7. Реализация проекта 17.09.2019- 29.11.2019
8. Закрытие проекта 29.11.2019

*** Проведение картирования процесса для формирования текущего состояния**

1. Составление карты потока текущего состояния.
2. Сбор фактических данных.
3. Анализ выявленных потерь и проблем.
4. Оцифровка целей проекта, их корректировка на базе результатов анализа текущего состояния.



Карта текущего состояния процесса «Создание алгоритма подготовки детей к творческим конкурсам»



ПРОБЛЕМЫ:

- 1 Отсутствие конкурсных афиш
- 2 Отсутствие доступа к положению конкурса
- 3 Постановка слишком сложных или слишком простых задач
- 4 Недостаточность сведений о участниках конкурса и их работе
- 5 Загруженность участников конкурса в других видах деятельности
- 6 Временные затраты
- 7 Низкий уровень культуры поведения участников конкурса
- 8 Напряженная атмосфера среди участников процесса



Пирамида проблем





Проведение картирования процесса для формирования целевого состояния


1. Разработка карты потока целевого состояния.
2. Определение путей достижения целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса.
3. Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков при реализации проекта и методов управления ими.
4. Разработка плана мероприятий по достижению целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса.



Пути решения проблем

1	Отсутствие конкурсных афиш	1	Выход на сайты учреждений, занимающихся организацией детских творческих конкурсов
2	Отсутствие доступа к положению конкурса	2	Проведение запроса о положении конкурса к его организаторам
3	Постановка слишком сложных или слишком простых задач	3	При подборе репертуара (или при выборе направления работы) руководствоваться требованиями конкурса, учитывать индивидуальные возможности каждого ребенка
4	Недостаточность сведений об участниках конкурса и их работе	4	Своевременный сбор необходимой информации
5	Загруженность участников конкурса в других видах работы	5	Мотивирование творческой деятельности, оказание конкурсантам материальной и моральной поддержки, введение в работу элементов ЗОЖ
6	Временные затраты	6	Составление плана работы и расписания, создание материально-технической базы и предметно-развивающей среды, использование эффективных образовательных технологий
7	Низкий уровень культуры поведения участников конкурса	7	Формирование навыков культуры поведения с учетом основных педагогических принципов
8	Напряженная атмосфера среди участников процесса	8	Проведение психологических тренингов

* Карта будущего состояния процесса «Создание алгоритма подготовки детей к творческим конкурсам»

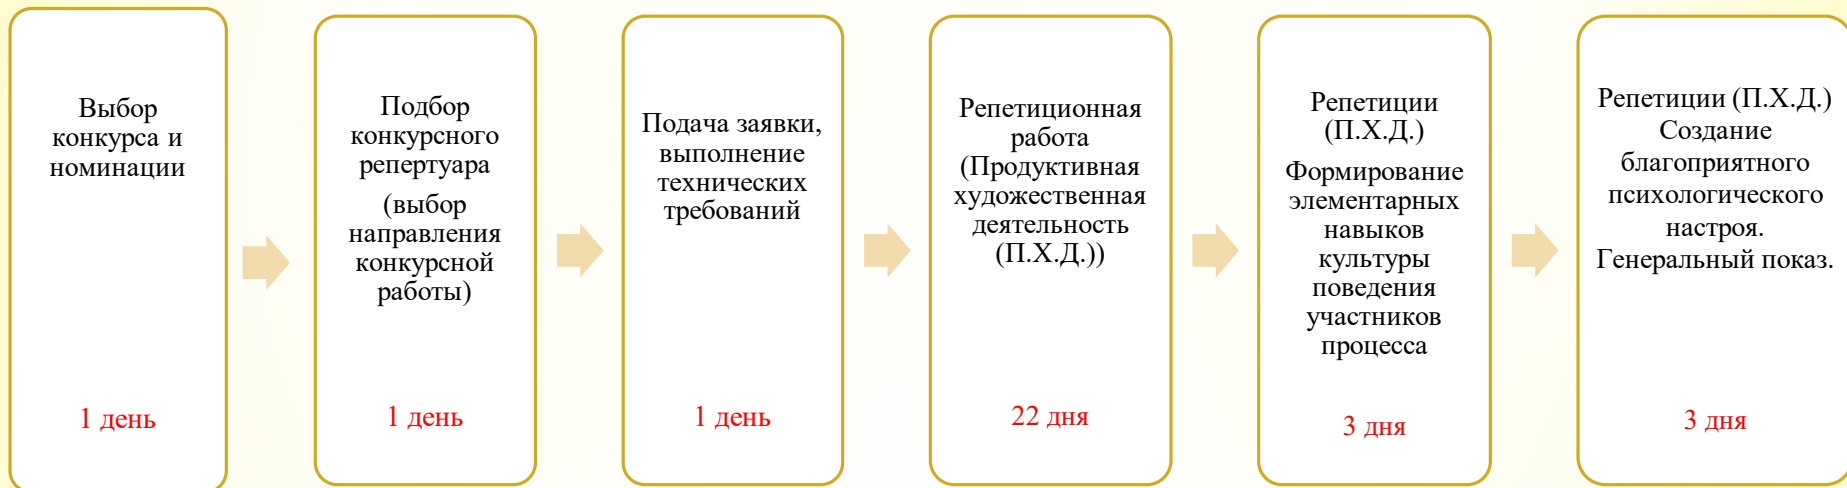



План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Проведение разъяснительной работы среди исполнителей	24.09.2019	Веретенникова Ж.А. Гридасова О.В. Мясищева И.В.
2	Составление плана подготовительной работы перед конкурсом, позволяющего структурировать и координировать систематическую деятельность участников проекта	25.10.2019	Мясищева И.В.
3	Апробация разработанного алгоритма подготовки к творческим конкурсам	18.10.2019 – 29.11.2019	Специалисты, работающие над подготовкой к творческим конкурсам



Реализация мероприятий по улучшению

1. Выполнение плана мероприятий по достижению целевого (идеального) состояния и целевых показателей процесса.
2. Мониторинг целевых показателей проекта и промежуточная оценка результатов реализации проекта.
3. Регулярное консультирование участников процесса по вопросам планирования, организации, осуществления и контроля групповой работы.
